BOOKLY

Telegram Mini App для онлайн-записи на услуги

PROJECT MANAGEMENT CASE STUDY

Учебный pet-project / MVP

Роль: Project Manager

Методология: Scrum

Инструменты: Jira, Miro, Perplexity AI

Румянцева Ульяна-Мария Александровна

2026

Учебный кейс, моделирующий управление разработкой MVP.

Описание проекта

Bookly — учебный кейс по управлению разработкой Telegram Mini App для онлайн-записи на услуги. Проект направлен на решение проблемы ручной обработки записей через переписку и телефонные звонки: клиенту нужно самостоятельно выбрать услугу, дату и доступное время в интерфейсе Telegram, а администратору — получить структурированную заявку.

В кейсе я выполняла роль Project Manager: сформировала Project Charter, Product Backlog и Sprint Plan, организовала Scrum-доску в Jira, определила стейкхолдеров, распределила роли через RACI, подготовила коммуникационный план, риск-реестр, QA-артефакты и Status Report.

AI-assisted requirements review

На примере SCRUM-10 использовала AI для проверки критериев приёмки. Рассмотрела замечания, уточнила необязательность комментария и зафиксировала открытые вопросы. Подробный разбор представлен в отдельном документе.

AI-assisted status summary

Использовала AI для подготовки черновика краткого статус-обновления по Sprint 1 Bookly. Проверила сводку по исходному Status Report, выявила упущенную задачу и уточнила формулировку о частичном достижении цели спринта.

Проект является учебной моделью: представленные планирование, метрики и результаты Sprint 1 демонстрируют применение инструментов управления разработкой MVP.

Параметр	Значение
Продукт	Telegram Mini App для онлайн-записи
Формат	Учебный pet-project / MVP
Роль	Project Manager
Методология	Scrum
Длительность	С 13.09.2026 по 30.10.2026
Инструменты	Jira, Miro
Sprint 1	18.09.2026 – 23.09.2026
Результат Sprint 1	4 из 5 задач; 16 из 18 SP; 89% выполнения

1. Обоснование проекта

Малому сервисному бизнесу неудобно обрабатывать записи клиентов только через переписку в Telegram и телефонные звонки. Администратору приходится вручную уточнять услугу, дату, время и контактные данные, что увеличивает время обработки обращений и риск ошибок.

Проект направлен на создание Telegram Mini App, которое позволит клиенту самостоятельно выбрать услугу и время записи в привычной среде Telegram, а администратору — получать структурированные заявки.

2. Цель проекта

Разработать MVP Telegram Mini App **Bookly** для онлайн-записи на услуги в период С 13.09.2026 по 30.10.2026.

Пользователь должен иметь возможность открыть приложение через Telegram-бота, просмотреть услуги, выбрать дату и время, заполнить форму и отправить заявку администратору.

3. Целевая аудитория

- Клиенты сервисного бизнеса, использующие Telegram.
- Администратор, который принимает и обрабатывает заявки.
- Владелец бизнеса, заинтересованный в автоматизации записи.

4. Scope проекта

Входит в MVP

- Открытие Mini App через Telegram-бота.
- Получение и безопасная серверная проверка данных авторизации пользователя, передаваемых Telegram Mini App.
- Каталог услуг: название, описание, цена и длительность.
- Выбор услуги.
- Выбор даты и доступного времени.
- Форма создания заявки с комментарием.
- Проверка обязательных полей формы.
- Сохранение заявки в базе данных.
- Уведомление администратора о новой заявке.
- Экран подтверждения успешной записи.

Не входит в MVP

- Онлайн-оплата.
- Промокоды, бонусы и программа лояльности.
- Перенос или отмена записи пользователем.
- Полноценная CRM-система.
- Расширенная аналитика для администратора.
- Нативное приложение для iOS и Android.

5. Сроки и этапы

Веха	Плановый срок	Результат
Подготовительный этап	13.09.2026 – 17.09.2026	Project Charter, Product Backlog, User Stories, прототип, оценки задач и Sprint Plan

Веха	Плановый срок	Результат
Sprint 1: базовый сценарий записи	18.09.2026 – 23.09.2026	Планируется реализовать открытие Mini App, просмотр каталога услуг, выбор даты и времени, базовую структуру данных и экран подтверждения записи
Разработка основного функционала	24.09.2026 – 08.10.2026	Планируется реализовать форму заявки, API, БД, сохранение заявок и уведомление администратора
Тестирование и исправления	09.10.2026 – 16.10.2026	Планируется провести тестирование, исправить выявленные дефекты и подготовить MVP к демонстрации
Подготовка к демонстрации	16.10.2026 – 30.10.2026	Планируется подготовить демонстрационную версию Mini App для пользовательского тестирования

6. Критерии успеха

Проект считается успешным, если к завершению MVP:

- Пользователь открывает Mini App через Telegram-бота.
- Пользователь видит каталог услуг с актуальными данными.
- Пользователь выбирает услугу, дату и свободное время.
- Пользователь успешно создаёт заявку.
- Заявка сохраняется в системе и не дублируется при повторной отправке.
- Администратор получает уведомление о новой заявке.
- Пользователь видит подтверждение созданной записи.
- В основном пользовательском сценарии отсутствуют блокирующие ошибки.

7. Основные риски

Риск	Вероятность	Влияние	Мера реагирования	Ответственный
Требования изменятся во время Sprint	Высокая	Среднее	Новые задачи добавлять в backlog следующего Sprint	PM
Нет доступа к боту, серверу или БД	Средняя	Высокое	Запросить все доступы до начала разработки	PM/Заказчик
Задержка Telegram-интеграции	Средняя	Высокое	Проверить сценарий запуска Mini App и авторизации в начале проекта	Backend-разработчик

Риск	Вероятность	Влияние	Мера реагирования	Ответственный
Не хватит времени на тестирование	Средняя	Высокое	Заложить QA-задачи и smoke-тестирование в Sprint	PM/QA
Возникнет двойная запись на один слот	Средняя	Высокое	Проверять доступность слота на сервере перед сохранением заявки	Backend-разработчик

Для управления работой использована Scrum-доска Jira со статусами To Do → In Progress → Testing → Done. Перед началом Sprint 1 были сформированы и приоритизированы Product Backlog и Sprint Backlog, задачи получили оценки в Story Points. Для контроля задач созданы JQL-фильтры по статусу, приоритету и принадлежности к Sprint 1.

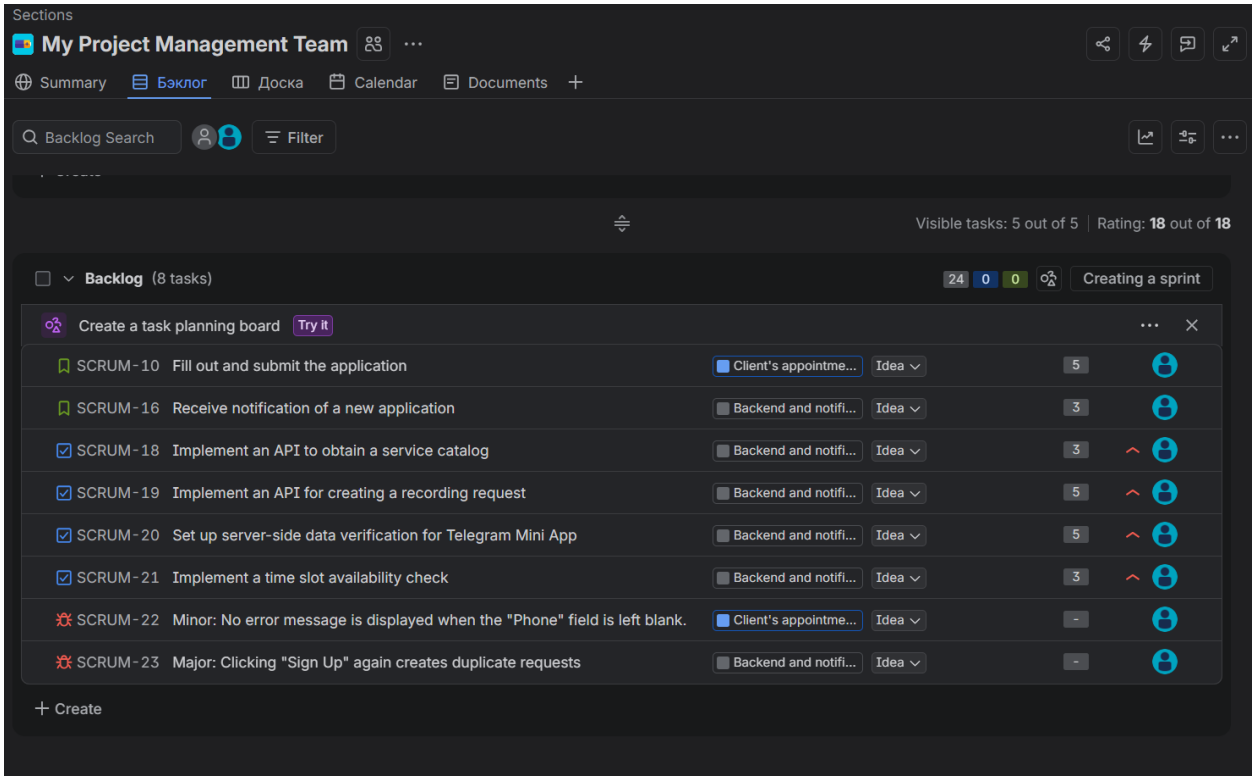


Рисунок 1 — Backlog проекта Bookly с элементами бэклога: Epic, User Story, Task и Bug.

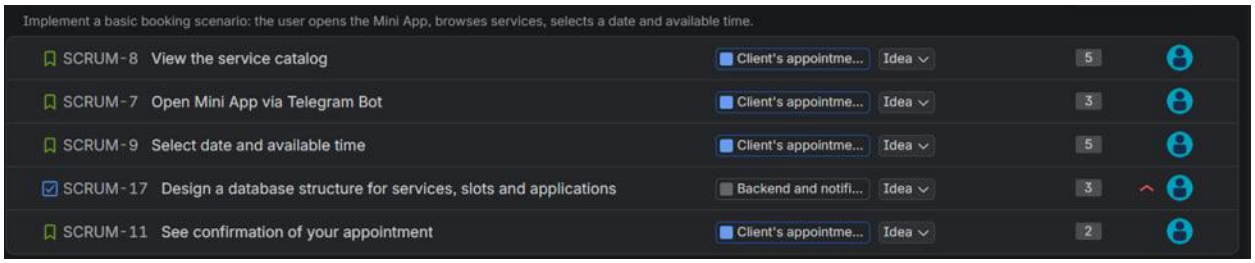


Рисунок 2 — Sprint 1 проекта Bookly на этапе планирования.

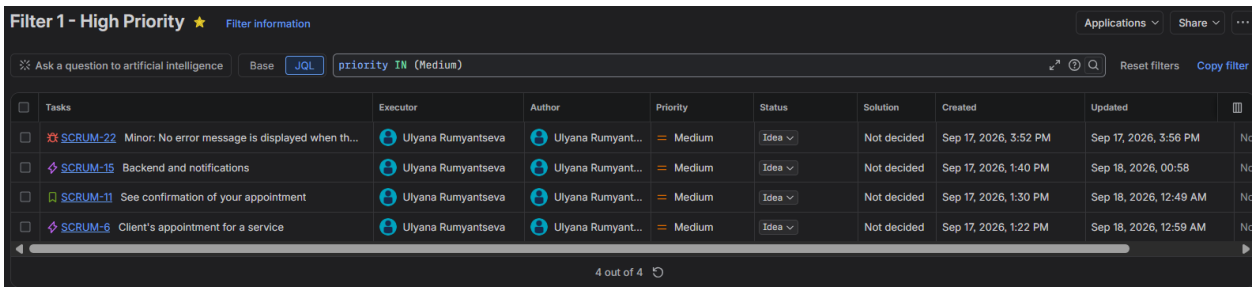


Рисунок 3 — Фильтр High Priority: отображение элементов бэклога с высоким приоритетом.

Таблица Sprint 1

Параметр	Значение
Период	18.09.2026 – 23.09.2026
Sprint Goal	Открытие Mini App, просмотр услуг, выбор даты и свободного времени
Плановый объём	5 задач / 18 SP
Результат	4 задачи / 16 SP
Незавершённая задача	Экран подтверждения записи / 2 SP

Status Report №1 — Sprint 1

Метрики

Метрика	Значение	Интерпретация
Плановый объём Sprint Backlog	18 SP	Объём пяти задач, выбранных в Sprint 1
Выполненный объём	16 SP	Объём полностью завершённых задач
Незавершённый объём	2 SP	Объём одной незавершённой задачи
Выполнение Sprint Backlog	89 %	16/18×100%
Velocity Sprint 1	16 SP	Количество Story Points, завершённых в Sprint 1
Средний Cycle Time	2 дня	Средняя длительность выполнения завершённых задач
Завершено задач	4 из 5	Одна задача возвращена в Product Backlog
Критические дефекты	1	Двойная запись на один временной слот

Метрика	Значение	Интерпретация
Заблокированные задачи	0	На момент закрытия Sprint 1 блокирующих зависимостей не зафиксировано

Sprint 1 завершён с отклонением от плана: выполнены 4 из 5 задач, или 16 из 18 Story Points. Задача «Увидеть подтверждение записи» объёмом 2 SP не достигла Definition of Done и возвращена в Product Backlog. Основной вывод Sprint 1 — необходимо уточнять критерии приёмки и использовать чек-лист Definition of Done перед переводом задач в Done.

Стейкхолдеры и роли

Матрица Влияние / Интерес

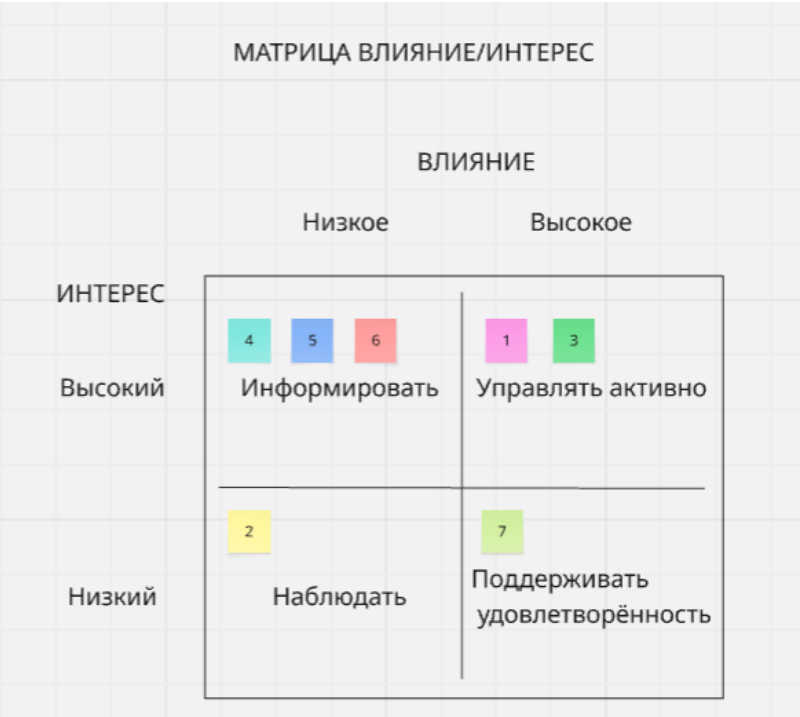


Рисунок 4 — Stakeholder Map проекта Bookly: матрица «Влияние/интерес».

Легенда к матрице «Влияние/интерес»

№	Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия
1	Владелец бизнеса / заказчик	Высокое	Высокий	Управлять активно
2	Telegram / внешний API	Низкое	Низкий	Наблюдать
3	Project Manager	Высокое	Высокий	Управлять активно
4	Frontend-разработчик	Низкое	Высокий	Информировать
5	Backend-разработчик	Низкое	Высокий	Информировать
6	QA-инженер	Низкое	Высокий	Информировать
7	Администратор сервиса	Высокое	Низкий	Поддерживать удовлетворённость

RACI-матрица

	Владелец бизнеса/заказчик	Клиенты	PM	Frontend	Backend	QA	ADMIN
Спроектировать структуру базы данных для услуг, слотов и заявок	C	I	A	C	R	C	I
Выбрать дату и свободное время	C	I	C	R/A	C	C	I
Просмотреть каталог услуг	C	I	C	R/A	C	C	I
Открыть Mini App через Telegram-бота	C	I	A	C	R	C	I
Увидеть подтверждение записи	C	I	A	R	R	C	I

Легенда к RACI-матрице

R — выполняет; A — отвечает за результат; C — консультирует; I — информируется.

Коммуникации

Коммуникационный план

Что сообщаем	Получатель	Канал	Когда	Ответственный
План первого спринта и задачи	Команда	Онлайн-встреча: Zoom или Google Meet, Miro/Telegram	В начале спринта	Project Manager
Статус задач и блокеры	Команда	Онлайн-встреча: Zoom или Google Meet, Telegram-чат	Ежедневно	Project Manager
Требования и изменения	Заказчик	Telegram/Miro	По необходимости	Project Manager
Услуги и доступные слоты	Администратор	Google Sheets/Telegram	В начале и при изменении	Project Manager
Результат спринта и обратная связь	Заказчик, администратор	Онлайн-встреча: Zoom или Google Meet	В конце спринта	Project Manager

QA и SDLC

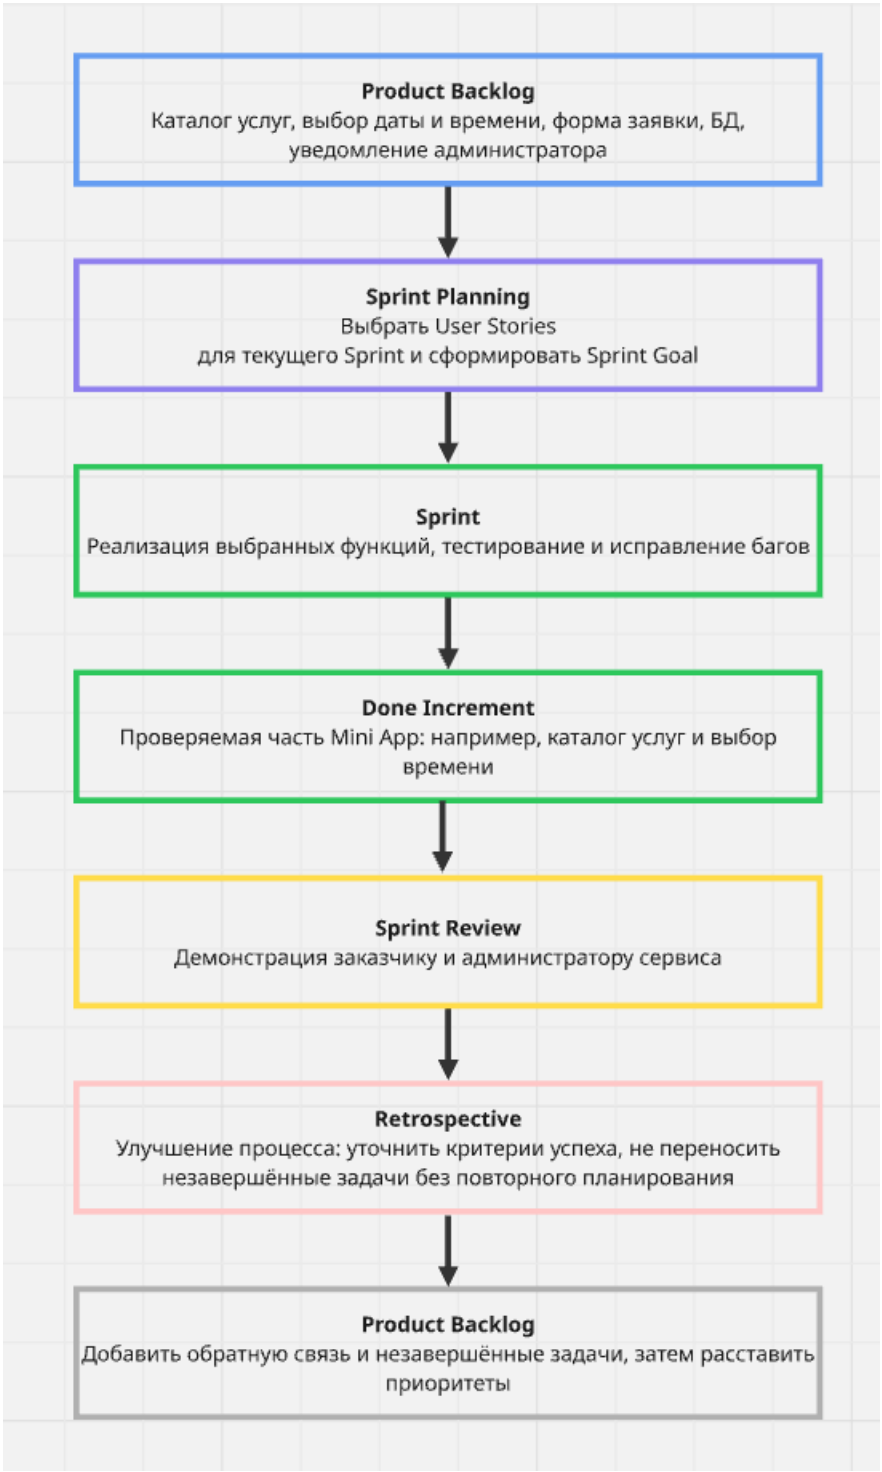


Рисунок 5 — Цикл разработки Bookly по Scrum.

Проект строится итеративно: Product Backlog уточняется, команда планирует Sprint, разрабатывает и тестирует выбранные задачи, демонстрирует проверяемый результат на Sprint Review и обновляет Backlog с учётом обратной связи.

Типы тестирования

Unit-тестирование – проверка отдельного модуля, функции или метода изолированно от остальных компонентов системы.

Например: проверить функцию валидации: заявка не отправляется, если не выбрана услуга или время.

Integration-тестирование – проверка взаимодействия нескольких модулей, сервисов или компонентов системы.

Например: проверить, что API сохраняет созданную заявку в БД и возвращает корректный ответ.

System-тестирование – проверка работы системы целиком на соответствие функциональным и техническим требованиям.

Например: пользователь открывает сайт, выбирает товар, добавляет его в корзину, оформляет заказ и получает подтверждение.

Acceptance-тестирование – проверка соответствия продукта бизнес-требованиям и критериям приёмки.

Например: заказчик подтверждает, что клиент может создать заявку без переписки с администратором.

Regression-тестирование – повторная проверка ранее работающих функций после изменений для выявления новых дефектов.

Например: после исправления формы повторно проверить каталог, выбор слота, создание заявки и подтверждение.

Smoke-тестирование – быстрая проверка ключевых функций сборки перед подробным тестированием.

Например: после новой сборки проверить запуск Mini App, отображение каталога, выбор времени и отправку заявки.

Баг-репорт

Поле	Значение
Заголовок	Два клиента могут успешно записаться на один и тот же временной слот
Предусловия	В каталоге есть свободный временной слот; используются два разных аккаунта Telegram
Шаги воспроизведения	1. Открыть Telegram Mini App под аккаунтом клиента №1. 2. Выбрать услугу, дату и свободный временной слот. 3. Отправить заявку. 4. Открыть Mini App под аккаунтом клиента №2. 5. Выбрать те же услугу, дату и слот. 6. Отправить заявку
Фактический результат	После первой записи слот остаётся доступным. Второй клиент также успешно создаёт заявку на те же дату и время

Поле	Значение
Ожидаемый результат	После первой заявки слот становится недоступным. При повторной попытке система показывает сообщение: «Выбранное время уже занято. Пожалуйста, выберите другой слот»
Окружение	Telegram Mini App; Android 14; Telegram 11.x
Серьёзность	**Critical**
Приоритет	**High**

Итоги и выводы

В рамках учебного кейса была смоделирована организация разработки MVP Telegram Mini App Bookly с использованием Scrum и Jira. Подготовлены ключевые управленческие артефакты: Project Charter, Product Backlog, Sprint Plan, Stakeholder Map, RACI-матрица, коммуникационный план, риск-реестр, QA-документация и Status Report.

Sprint 1 завершён с выполнением 89% планового объёма: закрыты 16 из 18 Story Points. Незавершённая задача была возвращена в Product Backlog, а критичный риск двойного бронирования был переведён в техническое требование к серверной проверке доступности слотов.

В следующем спринте необходимо уточнить критерии приёмки и Definition of Done, завершить сценарий подтверждения записи, реализовать форму создания заявки и серверное сохранение данных, а также провести smoke- и regression-тестирование.

Приложения

Приложение	Что вложить
Приложение A	Полный Project Charter
Приложение B	Полная RACI-матрица
Приложение C	Полный коммуникационный план
Приложение D	Status Report №1
Приложение E	Баг-репорт
Приложение F	Глоссарий API и БД
Приложение G	Скриншоты Jira: доска, backlog, JQL-фильтры
Приложение H	AI-assisted Project Management
Приложение I	AI-assistedstatus summary
